



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

HACIENDA Y ECONOMÍA

Enero-junio 2025

Proyecto de Inversión Pública

Informe de ejecución





Magín Díaz
Ministro de Hacienda y Economía

Martín Francos
Viceministro de Planificación e Inversión Pública

Francis Ortega
Director de Inversión Pública

Víctor Hughes
Encargado de Formulación y Programación de la Inversión Pública

Eddy Gomera
Encargado de Administración de la Información de la Inversión Pública

Yanna Dishmey
Encargada de Proyectos de Alianzas Público - Privadas

Solendy Capellán
Encargada de la División de Seguimiento de la Inversión Pública

Vickeisy Mercado
Coordinación Técnica

Equipo técnico:

José Bencosme
José Cabreja
Wilna Casado
Carlos Cedeño
Eira Curiel
Freddy Martínez
Julio Fanith
Damnia Gomera

Yuderca Jiménez
Glenn Holguín
Diandra Lora
Liana Lama
Pilar Melgarejo
Luisa Miolán
Keny Montero
Nataly Nova

Alberto Pichardo
Madeleine Rivera
Emma Rodríguez
Amín Santana
Raúl Santos
Ana F. Mejía

Tabla de Contenido

1. Panorama general de la ejecución de Proyectos de Inversión Pública (PIP)	8
2. Composición de la ejecución de los Proyectos de Inversión Pública (PIP)	10
2.1. Análisis por institución ejecutora	10
2.2. Análisis según clasificación funcional	12
2.3. Análisis por zona geográfica	13
2.4. Análisis según fuentes de financiamiento	14
2.5. Análisis según tipología del proyecto	15
2.6. Análisis según sector institucional	16
3. Contribución de los Proyectos de Inversión Pública a la Estrategia Nacional de Desarrollo	17
4. Proyectos con mayor ejecución entre enero-junio 2025	18
5. Anexos	19

Índice de gráficos

Gráfico 1. Evolución trimestral de la ejecución de PIP, 2018-2025	8
Gráfico 2. Ejecución financiera de PIP, enero-junio 2018-2025	8
Gráfico 3. PIP programado anual vs. ejecutado, enero-junio 2018-2025.....	9
Gráfico 4. PIP ejecutados como porcentaje del PIB enero-junio, 2018-2025	9
Gráfico 5. PIP programado anual vs. ejecutado por institución ejecutora, enero-junio 2025.....	10
Gráfico 6. PIP ejecutados y participación porcentual en la ejecución total por función/subfunción, enero-junio 2025	12
Gráfico 7. PIP ejecutados a nivel provincial, enero - junio 2025	13
Gráfico 8. PIP per cápita ejecutados a nivel provincial, enero-junio 2025	13
Gráfico 9. Distribución porcentual del monto ejecutado de los PIP por fuentes de financiamiento.....	14
Gráfico 10. Instituciones financiadoras del crédito externo	14
Gráfico 11. PIP por tipología y proporción de la ejecución, enero-junio 2025	15
Gráfico 12. Proyectos de Inversión Pública programados (anual vs. ejecutado) por tipología y estado, enero-junio 2025	15
Gráfico 13. Distribución porcentual del monto ejecutado en PIP por Subsector Institucional, enero-junio 2025.	16
Gráfico 14. PIP ejecutado por Subsector Institucional, enero-junio 2025	16
Gráfico 15. Distribución porcentual del monto ejecutado de los PIP por eje de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END)	17
Gráfico 16. PIP por eje de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END)	17

Índice de tablas

Tabla 1. Proyectos de Inversión Pública con mayor ejecución enero-junio 2025.....	18
---	----

Lista de siglas

BCRD: Banco Central de la República Dominicana.	PNPSP: Plan Nacional Plurianual del Sector Público.
END: Estrategia Nacional de Desarrollo.	PIP: Proyecto de Inversión Pública.
ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible.	

Glosario

Clasificación funcional del gasto: agrupa los gastos que realizan las instituciones públicas, de acuerdo con las funciones a las que contribuyen los proyectos de inversión pública.

Fuente de financiamiento: hace referencia a la fuente de donde provienen los ingresos para ejecutar los proyectos de inversión pública. Si los ingresos son del grupo interno (Estado dominicano), la fuente es general; si se derivan de préstamos y donaciones externas, la fuente es el crédito externo y donaciones, respectivamente.

Gasto de capital: son los gastos destinados a la adquisición, instalación y acondicionamiento de activos de capital fijo. Los gastos de capital incluyen los pagos con contraprestación, como son: inmuebles, maquinarias, activos intangibles, etc., y pagos sin contraprestación, como las transferencias de capital.

Institución ejecutora: es la encargada de la realización del PIP en términos administrativos, técnicos y financiero, e incluye entre otros la formulación, contratación, presupuestación y pagos de los proyectos bajo su cargo.

Inversión programada: se refiere a los montos que las instituciones ejecutoras proyectan devengar durante el período de programación para llevar a cabo los PIP.

Nivel de gobierno: se fundamenta en la estructura organizativa del sector público y refleja las instituciones y áreas responsables a las que se asignan las apropiaciones presupuestarias conforme a su naturaleza, misiones, régimen de derechos y obligaciones (estatus jurídico).

Proyecto Inversión Pública aprobado: es un proyecto de inversión que cuenta con el informe favorable del SNIP, porque su estudio de preinversión

demuestra su viabilidad técnica, económica, social y ambiental.

Proyecto de Inversión Pública (PIP): es el conjunto de actividades que requieren del uso de recursos del presupuesto público, con un inicio y fin claramente definidos y con una localización geográfica específica, cuyo objetivo es la generación de capacidad expresada en capital fijo, capital humano o creación de conocimiento.

Situación presupuestaria: el SNIP clasifica los proyectos de inversión, de acuerdo con su situación presupuestaria, en nuevos y de arrastre:

- **Nuevo:** cuando ha sido declarado admisible por el MEPyD y registrado en el SNIP y no tiene monto devengado en ninguno de sus componentes.
- **Arrastre:** cuando su ejecución ha sido iniciada en años anteriores, es decir, cuando tiene montos devengados en alguno de sus componentes en años presupuestarios anteriores al año presupuestario para el que se están solicitando recursos financieros.

Tipología de proyectos: se reconocen tres tipologías:

- **Capital fijo:** creación, incremento, rehabilitación y mejora de la capacidad instalada para la producción de bienes o la prestación de servicios.
- **Capital humano:** implementación, mantenimiento y recuperación de la eficiencia y productividad del capital humano.
- **Creación de conocimiento:** está vinculado a investigaciones, desarrollos tecnológicos, catastros, diagnósticos, inventarios, censos y cualquier otro tipo de acción orientada a la creación de conocimiento y que, por tanto, genere valor agregado en el ambiente que se desarrolle.

Fuentes de información

Las informaciones de este informe provienen del Sistema Nacional de Inversión Pública, según lo reportado por las instituciones ejecutoras, respecto del avance físico y financiero de cada uno de los proyectos incluidos en el Plan de Inversión Pública 2025.

Para tales fines, las instituciones ejecutoras registraron, hasta el 31 de junio de 2025, la ejecución física y financiera de cada proyecto de inversión pública a través del sistema de información del SNIP. Dichos registros fueron validados posteriormente por los analistas de la DGIP, luego de contrastar con otras fuentes (como SIGEF y UEPEX), tras lo cual se procede a elaborar el presente informe.

Introducción

El Ministerio de Hacienda y Economía, como órgano rector de las finanzas públicas y del Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública (SNPIP), tiene dentro de sus responsabilidades verificar que los proyectos de inversión pública (PIP) estén alineados a las prioridades de desarrollo pautadas en los instrumentos del sistema. Entre estos se destaca la de Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 2030, la cual define la visión de desarrollo del país a largo plazo, y el Plan Nacional Plurianual del Sector Público (PNPSP), el cual se actualiza anualmente y contiene la producción pública prioritaria en el mediano plazo. Adicionalmente, la inversión pública se debe encaminar hacia el cumplimiento de la Agenda 2030 para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), de la cual la República Dominicana es signataria.

Un adecuado seguimiento a la ejecución de los proyectos de inversión cumple con la cultura de rendición de cuentas y provisión de información que permite identificar tendencias en la asignación de fondos y la toma de decisiones en la gestión de recursos públicos. En este tenor, el Decreto 231-07, que establece el Reglamento Orgánico Funcional del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), le asigna a la Dirección General de Inversión Pública (DGIP) la función de *“Analizar y evaluar la ejecución de la inversión pública y preparar el informe semestral al Congreso, sobre el estado de ejecución de los proyectos de inversión del sector público, así como otros informes que le sean requeridos”* (Literal n, Artículo 21). A su vez, el Decreto 493-07, de Reglamento para la Ley 498-06 de Planificación e Inversión Pública, indica que *“... la DGIP emitirá su informe sobre la ejecución de los proyectos de inversión, cualquiera sea su tipología, donde evaluará los resultados de la programación de inversiones, el grado de cumplimiento de la programación física y financiera, y verificará, a través de una muestra con visitas de campo, que los proyectos en ejecución visitados no hayan sido modificados en su naturaleza durante su contratación o desarrollo”*.


En cumplimiento con las referidas disposiciones se presenta este informe, el cual tiene como propósito analizar el estado de ejecución de los proyectos de inversión pública (PIP) durante el primer semestre 2025. Asimismo, mediante la desagregación de los montos ejecutados en diferentes categorías, permite identificar en qué medida el Estado, en su acción de proveer bienes y servicios públicos a través de proyectos de inversión pública, está contribuyendo al logro de los objetivos planteados por la nación en el largo plazo.

En el primer capítulo se presenta el panorama histórico de ejecución de los PIP desde 2018 hasta enero-junio 2025 y se detalla la ejecución según su tipología, estado de proyectos, fuente de financiamiento, subsector institucional, clasificación funcional y por institución ejecutora. Además, se presenta el Índice de Ejecución de Proyectos (IEP). Seguido, se analiza la contribución de los PIP al desarrollo nacional mediante su vinculación a la END. Por último, se especifican los proyectos de inversión pública de mayor ejecución durante el primer semestre 2025.

1. Panorama general de la ejecución de Proyectos de Inversión Pública (PIP)

Para el primer trimestre de 2025, la ejecución financiera de los proyectos de inversión pública fue de RD\$ 12,128.6 millones, incrementando en el segundo trimestre a RD\$ 25,721.9 millones, para un total acumulado de RD\$ 37,850.5 millones para el primer semestre 2025.


Gráfico 1. Evolución trimestral de la ejecución de PIP, 2018-2025 (Millones RD\$)

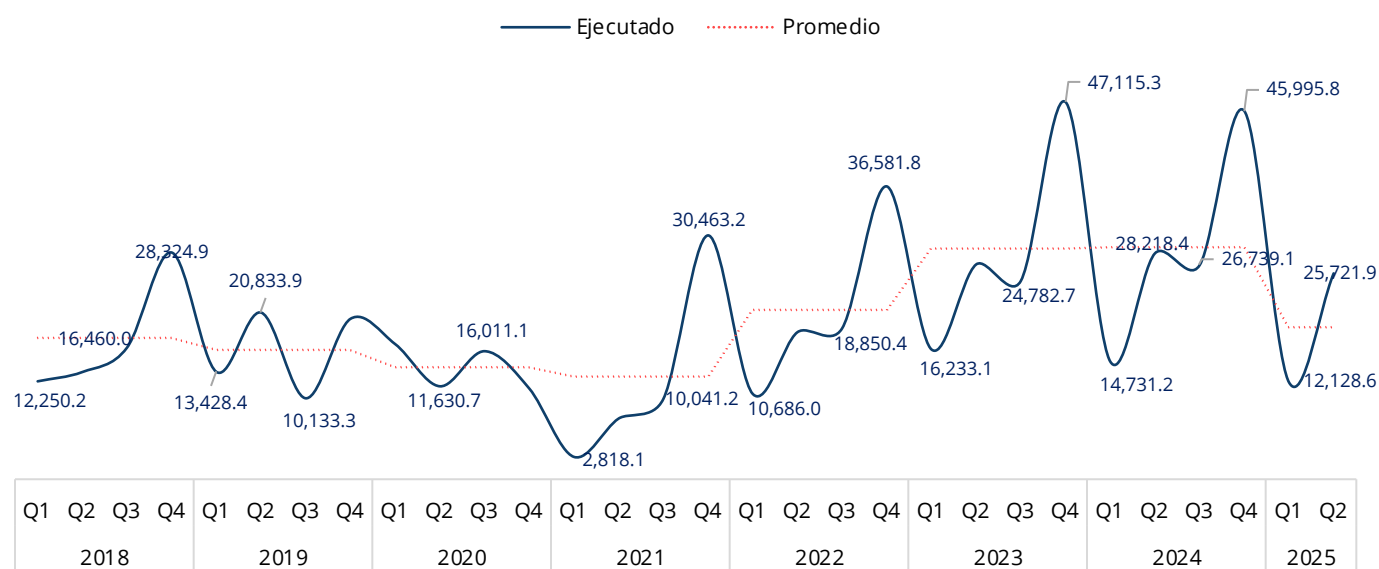

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), MEPyD.

La ejecución financiera en el semestre, de RD\$ 37,850.5 millones, supone una disminución respecto al mismo periodo del 2024. Sin embargo, se mantiene entre las más altas de los últimos ocho años.


Gráfico 2. Ejecución financiera de PIP, enero-junio 2018-2025 (Millones RD\$)

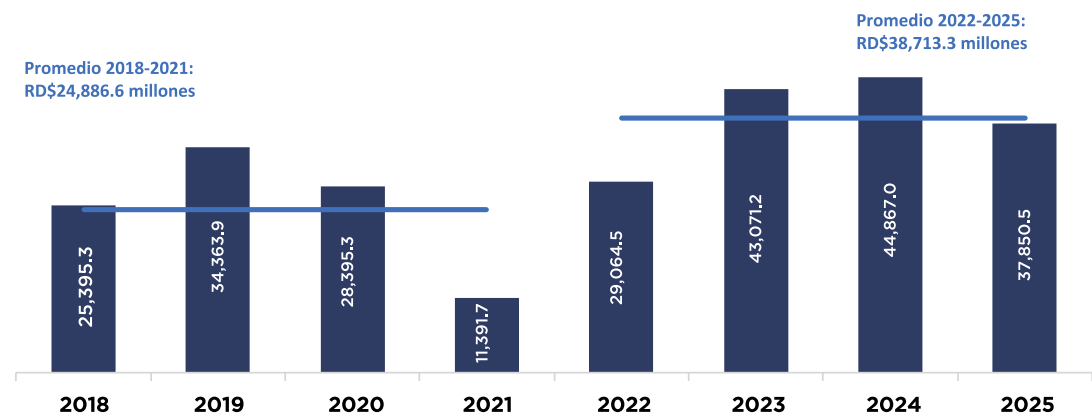

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), MEPyD.

Analizando la ejecución respecto a la programación inicial para el año, se observa que el porcentaje de ejecución para el primer semestre fue de 40.1 %, por encima del promedio de ejecución histórico de 37 %.


Gráfico 3. PIP programado anual vs. ejecutado, enero-junio 2018-2025
(Millones RD\$)

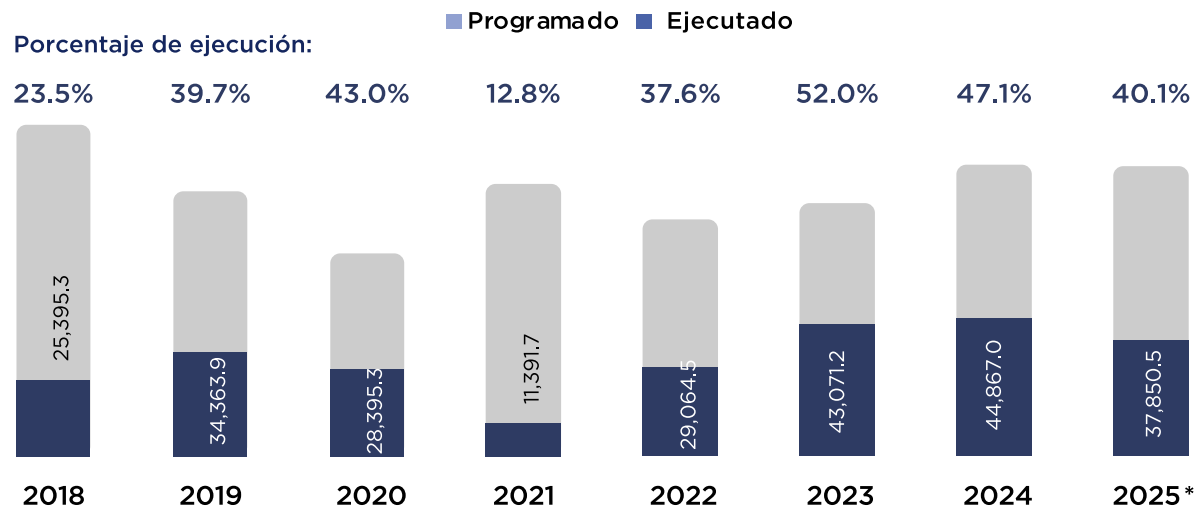

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), MEPyD.

Al analizar como porcentaje del PIB para el primer semestre 2025, las inversiones ejecutadas se ubicaron en 1.0 % como proporción del PIB, mostrando una variación de -0.2 % respecto al mismo periodo 2024.

Gráfico 4. PIP ejecutados como porcentaje del PIB
enero-junio, 2018-2025

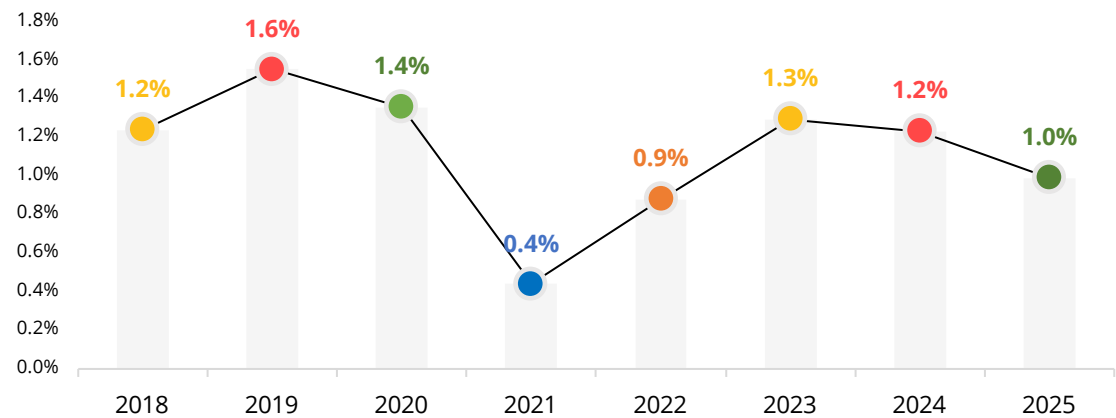

Nota: para el PIB enero-junio 2025 se hizo una proyección a partir de datos del Banco Central.

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública y Banco Central de la República Dominicana.

2. Composición de la ejecución de los Proyectos de Inversión Pública (PIP)


A continuación, se detalla la ejecución acumulada para el primer semestre 2025, según distintas clasificaciones de los proyectos.

2.1. Análisis por institución ejecutora

La distribución de la ejecución total de proyectos entre las instituciones ejecutoras es encabezada por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), con un monto de RD\$ 16,046.3 millones (42.4 % de la ejecución total), seguido del Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (MIVED) con RD\$ 7,241.4 millones (19.1 % del total ejecutado) y por el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), con RD\$ 3,511.3 millones, equivalente a un 9.3% de la ejecución total. Estas tres instituciones ocupan el 70.8 % del total de la ejecución del primer semestre.


La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN) fue la institución con mayor ejecución respecto a su programación del año, con un monto ejecutado de RD\$ 626.0 millones o 75.5 % de su programación para el año, seguido por el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), con 60.2 % y el Ministerio de Vivienda y Edificaciones (MIVED) con una ejecución de 55.7 % del monto programado para el año por dicha institución.

Gráfico 5. PIP programado anual vs. ejecutado por institución ejecutora, enero-junio 2025 (Millones RD\$)

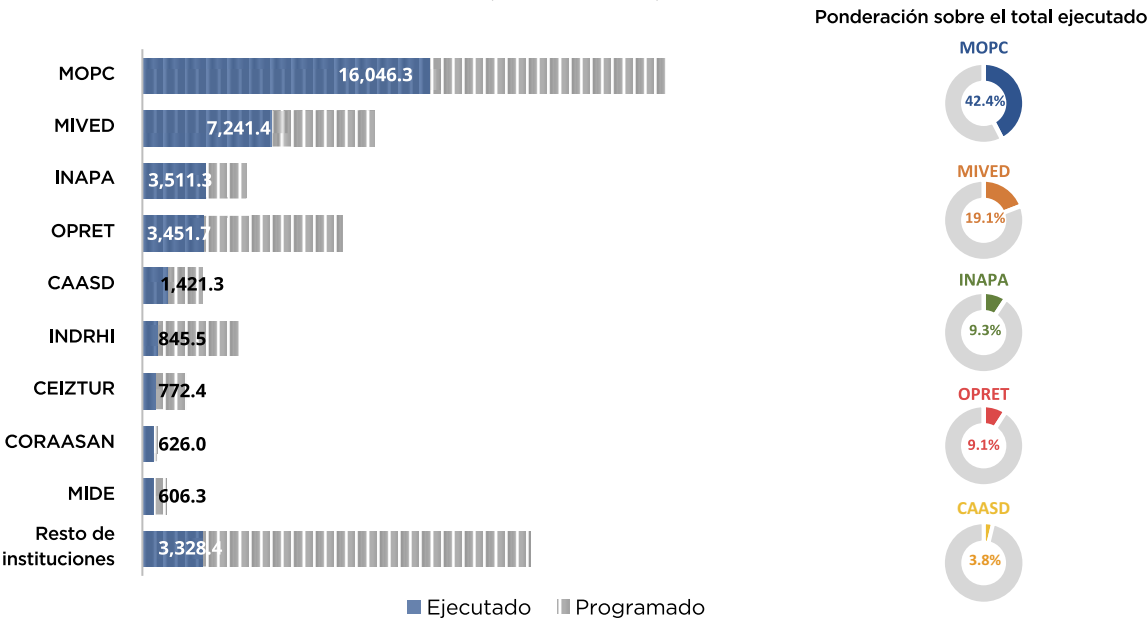

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), MEPyD.

Índice de Ejecución de Proyectos (IEP)

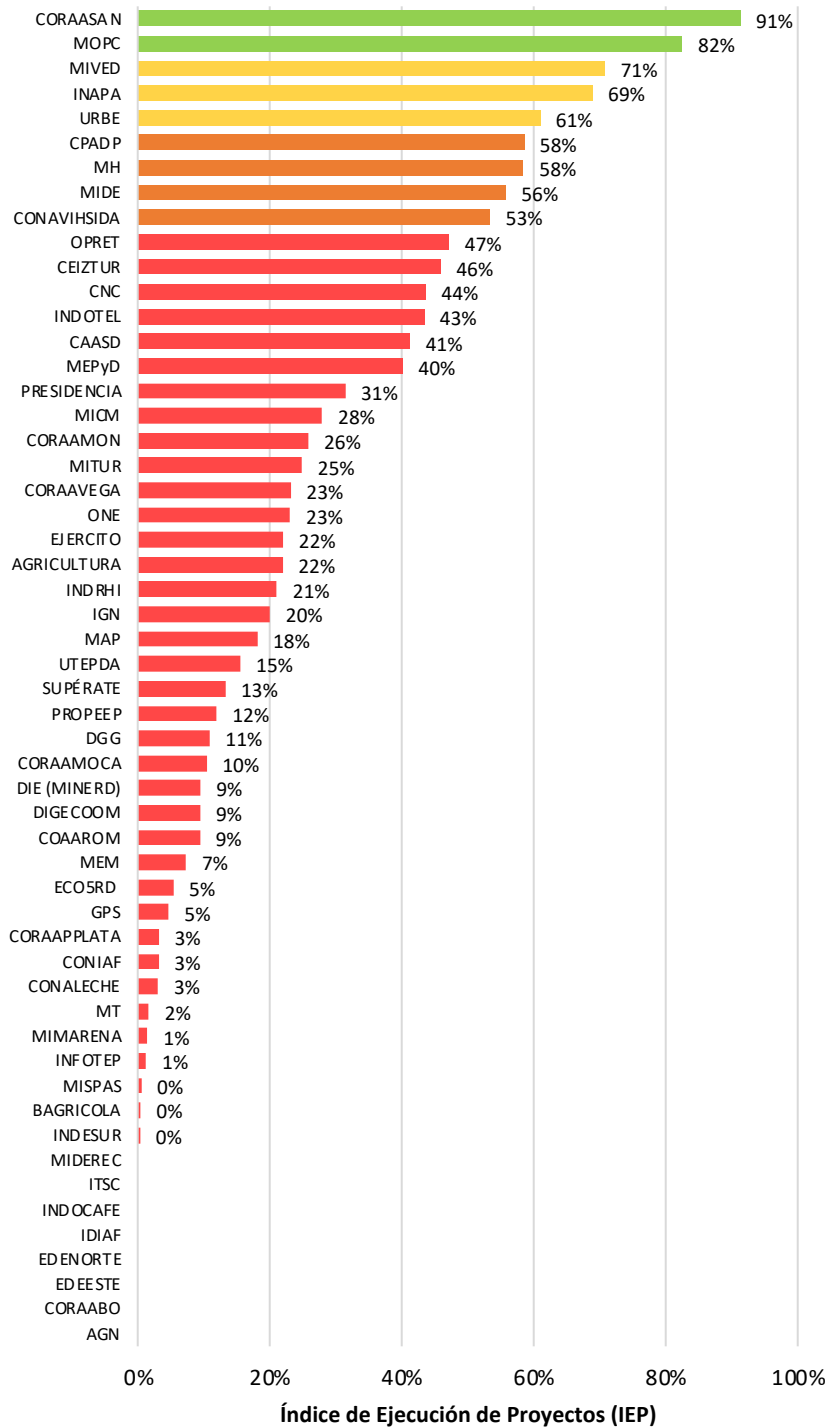

El Índice de Ejecución Institucional (IEI)¹ es un indicador que mide el grado de cumplimiento de la ejecución presupuestaria de proyectos de inversión pública a nivel institucional. Su objetivo principal es evaluar el desempeño de una institución en la gestión eficiente de los recursos financieros asignados.

La medición del IEI toma en cuenta dos dimensiones: (1) el monto total ejecutado ponderado por el tiempo transcurrido del periodo en relación con la asignación presupuestaria institucional, y (2) el grado de ejecución individual de cada uno de los proyectos vigentes bajo su responsabilidad. Un IEI cercano o superior al 100 % indica una buena ejecución, mientras que valores inferiores señalan posibles retrasos que requieren atención.

Los resultados indican que el mayor IEP es de la CORAASAN, que alcanza el 91 %, debido a una ejecución financiera superior al ritmo semestral promedio (50 %), combinado con una alta cobertura de ejecución de sus proyectos vigentes. Es decir, que gran parte de los proyectos bajo su responsabilidad con recursos asignados se encuentran con una ejecución superior o igual al 50 %.


¹Ver nota metodológica en anexo 2.

2.2. Análisis según clasificación funcional²

La mayor cantidad de recursos fue destinada a la función Transporte, enfocados principalmente en carreteras, por un monto de RD\$ 14,680.4 millones y a la *construcción y ampliación del metro de Santo Domingo*, con una inversión de RD\$ 3,451.7 millones, para un acumulado en dicho sector de RD\$ 18,156.8 millones (48 % del total ejecutado); seguida de la función Vivienda y servicios comunitarios, compuesta por *Abastecimiento de agua potable*, con una ejecución de RD\$ 3,381.6 millones y *Urbanización y servicios comunitarios* con un monto de RD\$ 1,360.7 millones. Estas dos funciones, en conjunto, representaron el 61 % del monto total ejecutado en el primer semestre 2025.

La tercera función con mayor inversión fue Salud, con un monto ejecutado de RD\$ 3,566.5 millones o 9 % del total. Otros sectores con inversiones significativas fueron *Protección del aire, agua y suelo* y *Actividades deportivas, recreativas y culturales* con montos respectivos de RD\$ 2,472.6 millones y RD\$ 1,849.4 millones.

Gráfico 6. PIP ejecutados y participación porcentual en la ejecución total por función/subfunción, enero-junio 2025 (millones RD\$)

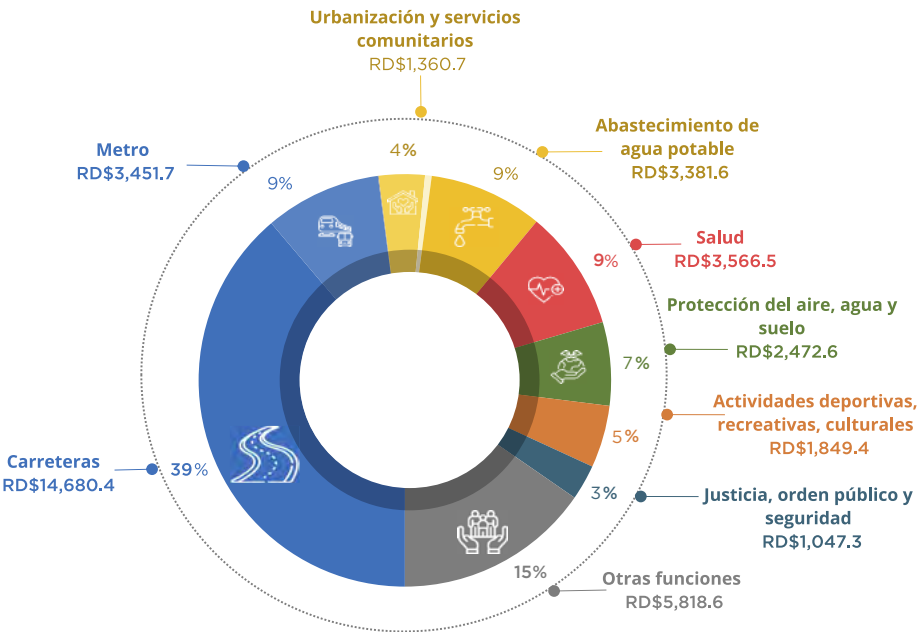

Nota:
Transporte = Carreteras + Metro + Planificación, gestión y supervisión.
Vivienda y servicios comunitarios = Urbanización y servicios comunitarios + Abastecimiento de agua potable + Desarrollo comunitario.

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública, MEPyD.

² Para más información, ver anexo 1.

2.3. Análisis por zona geográfica

Una dimensión importante de analizar es la distribución de la inversión pública a lo largo del territorio nacional. De los RD\$ 37,850.5 millones ejecutados en el primer semestre, unos RD\$ 9,455.2 millones (25 % de la ejecución total) fueron destinados a la provincia de Santo Domingo, de los cuales, el 30 % fueron invertidos en la *Construcción de la línea 2C del metro de Santo Domingo: Alcarrizos-Luperón*.

El Distrito Nacional fue la segunda provincia con mayor ejecución, con un monto de RD\$ 3,895.1 millones (10.3 % de la ejecución total) destinados principalmente a la *Reparación de las instalaciones deportivas del centro olímpico Juan Pablo Duarte y la Construcción de la ciudad sanitaria Dr. Luis E. Aybar*.

En adición, existen otros proyectos que tienen un alcance territorial más allá de una sola provincia; en este sentido, se registraron alrededor de RD\$ 800.2 millones (2.1 % del total) en proyectos de alcance nacional y RD\$ 313.3 millones de alcance regional.

A pesar de que se evidencia una concentración de la inversión pública en provincias con una mayor población urbana, como el “Gran Santo Domingo”, es necesario acompañar este análisis con los proyectos de inversión pública por cada habitante de las provincias.

En este contexto, las provincias con mayor inversión *per cápita* durante el primer semestre fueron:

- Pedernales, con una inversión per cápita de RD\$ 43,862.7, enfocados principalmente a la construcción de la carretera para el desarrollo turístico de Cabo Rojo.
- San José de Ocoa, con RD\$ 10,936.7 per cápita, reflejando los esfuerzos en mejorar la infraestructura vial y los servicios comunitarios.
- María Trinidad Sánchez, con RD\$ 10,823.4 por cada habitante. Los proyectos desarrollados en esta provincia están enfocados principalmente a la construcción/reconstrucción de carreteras.

Gráfico 7. PIP ejecutados a nivel provincial, enero - junio 2025


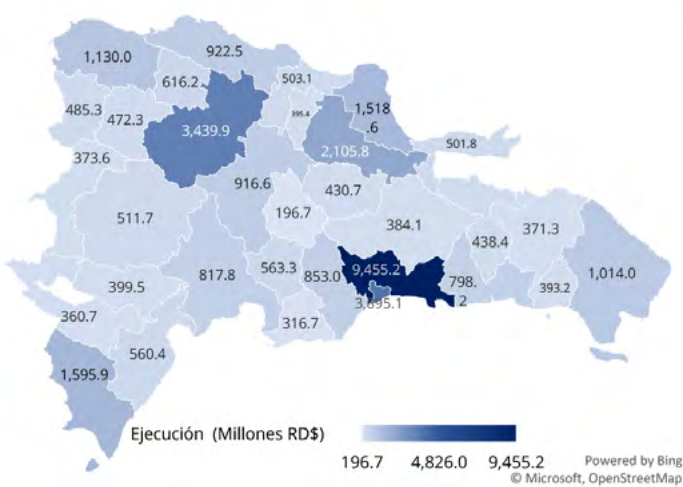



Gráfico 8. PIP per cápita ejecutados a nivel provincial, enero-junio 2025

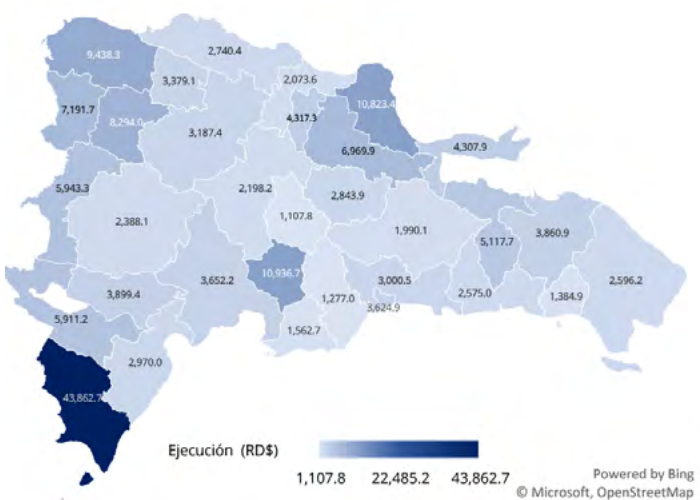

2.4. Análisis según fuentes de financiamiento

Según las fuentes de financiamiento, la mayoría de los PIP ejecutados en el primer semestre fueron financiados con el Fondo general, por un monto de RD\$ 31,407.7 millones (83.0 %). La segunda fuente más frecuente resultó ser *Crédito externo* que financió el 16.6 % de la ejecución total (RD\$ 6,283.0 millones), seguido de las Donaciones que financiaron RD\$ 159.7 millones (0.4 %).

Gráfico 9. Distribución porcentual del monto ejecutado de los PIP por fuentes de financiamiento.

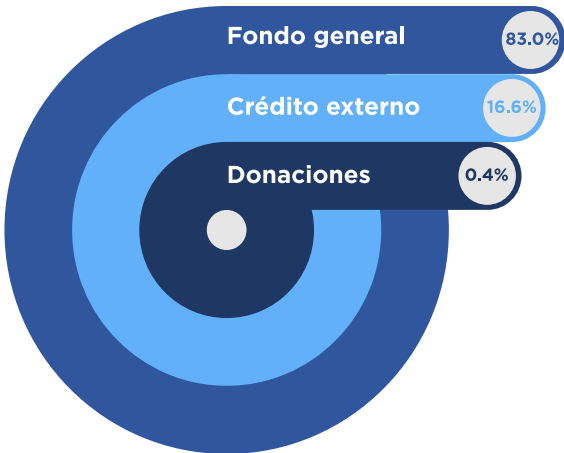

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública, MEPyD.

En cuanto a los RD\$ 6,283.0 millones de financiamiento con crédito externo, el 32.2 % procedió del Banco Centroamericano de Integración Económica con RD\$ 2,021.0 millones, seguido de un 22.1 % financiados con Bonos globales externos y, en tercer lugar, un 18.7 % del Banco Interamericano de Desarrollo, con RD\$ 1,175.7 millones.

Gráfico 10. Instituciones financiadoras del crédito externo (Millones RD\$)




Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública, MEPyD.

2.5. Análisis según tipología del proyecto

Los proyectos de Capital fijo mostraron la mayor ejecución financiera, por un monto de RD\$ 37,153.9 millones (98.2 % respecto al total ejecutado), seguido de Capital humano, con una inversión de RD\$ 654.9 millones, destinada principalmente a la *Prevención y atención a la población de mayor riesgo al VIH*, y por último, los proyectos de *Creación de conocimiento* por RD\$ 41.8 millones de los cuales más del 30 % corresponde a la ejecución del *Estudio de factibilidad para la construcción Presa de Joca*.

Gráfico 11. PIP por tipología y proporción de la ejecución, enero-junio 2025.

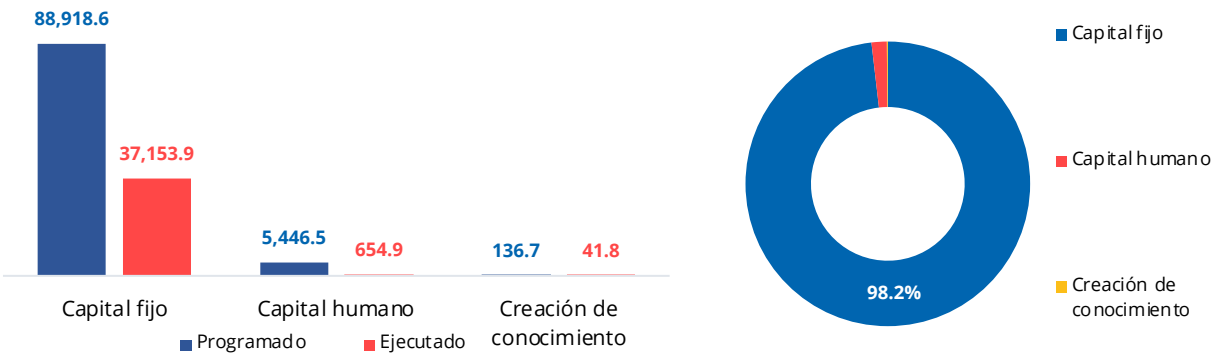

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública, MEPyD.

En las tres tipologías, la mayoría de los proyectos son de arrastre, en cumplimiento con el compromiso del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), de priorizar y dar continuidad y/o terminación a los proyectos ya iniciados. Para los proyectos de Capital fijo se ejecutó un monto de RD\$ 34,366.8 millones en proyectos de arrastre, y unos RD\$ 2,787.2 millones en proyectos nuevos.

Gráfico 12. Proyectos de Inversión Pública programados (anual vs. ejecutado) por tipología y estado, enero-junio 2025 (millones RD\$).




Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública, MEPyD.

2.6. Análisis según sector institucional

El Gobierno central fue el subsector institucional que ejecutó la mayor parte de las inversiones, con un 81.3 % de toda la ejecución, seguido de las Empresas públicas no financieras (15.2 %) y las Instituciones públicas descentralizadas y autónomas (3.3 %).


Gráfico 13. Distribución porcentual del monto ejecutado en PIP por Subsector Institucional, enero-junio 2025.

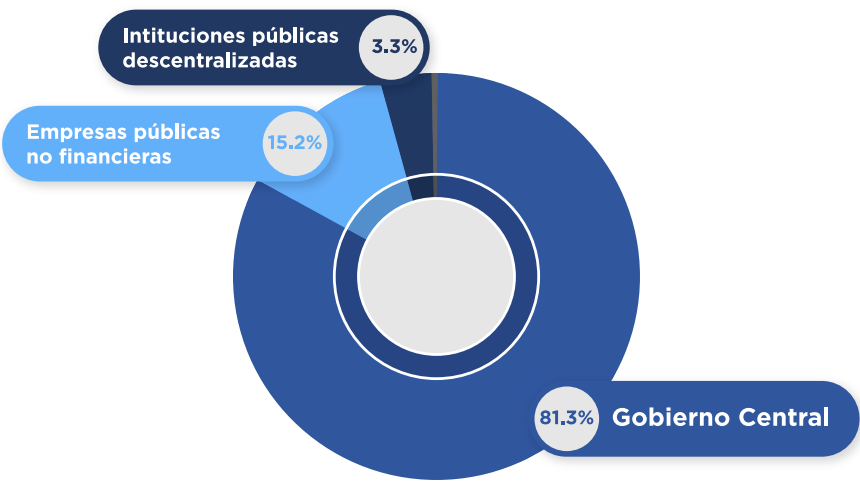

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública, MEPyD.

Las Empresas públicas no financieras tuvieron el mayor porcentaje de ejecución respecto a su programación (48.9 %). pero el mayor monto ejecutado estuvo en manos del Gobierno central, con RD\$ 30,770.5 millones.

Gráfico 14. PIP ejecutado por Subsector Institucional, enero-junio 2025 (Millones RD\$)

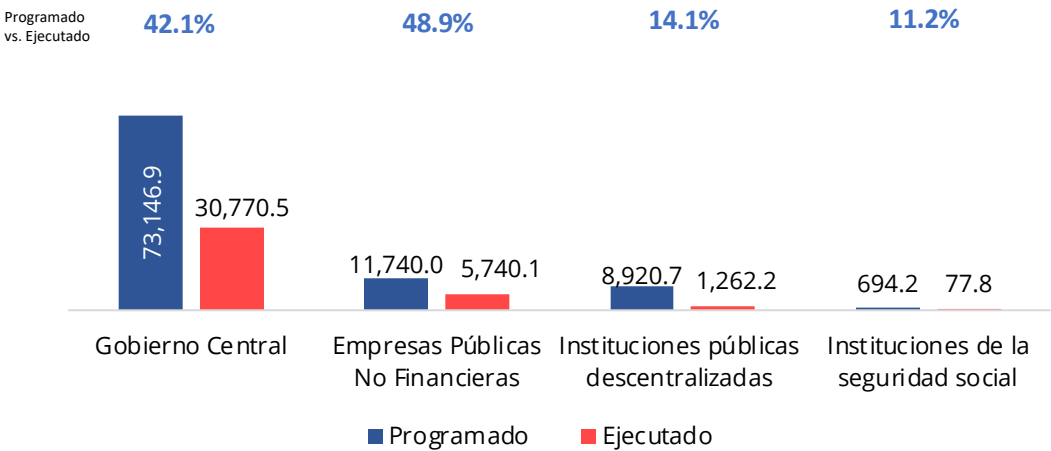


Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública, MEPyD.

3. Contribución de los Proyectos de Inversión Pública a la Estrategia Nacional de Desarrollo

Los proyectos de inversión pública permiten la realización de actividades que contribuyen a la materialización de los objetivos y las metas de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END). Al analizar la participación de proyectos vinculados a cada eje sobre el total ejecutado en el periodo, el eje con mayor representación es el tercero, el de *Economía sostenible, integradora y competitiva*, con un 55.6 %, seguido del segundo, de *Sociedad con igualdad de derechos y oportunidades* (36.5 %); el primero, de *Estado Social Democrático de Derecho*, con 5.0 % y, por último, el cuarto, de *Sociedad de producción y consumo ambientalmente sostenible que adapta al cambio climático*, con un 2.9 %.

Gráfico 15. Distribución porcentual del monto ejecutado de los PIP por eje de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END)




Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública, MEPyD.

Los proyectos vinculados al segundo eje fueron los que alcanzaron el mayor porcentaje de ejecución con respecto a lo programado para el año, con un monto ejecutado de RD\$ 13,810.1 millones (44.2 %). Le sigue el tercer eje, con una ejecución de RD\$ 21,029.1 millones (43.1 %). Luego, el primer eje, que efectuó una ejecución de RD\$ 1,898.9 millones, representado el 30.0 % del monto programado para el año. Por último, el cuarto eje ejecutó un monto de RD\$ 1,112.5 millones, con un porcentaje de ejecución de 13.8 %.

Gráfico 16. PIP por eje de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) (Millones RD\$)

Ejecutado (E) vs programado (P)

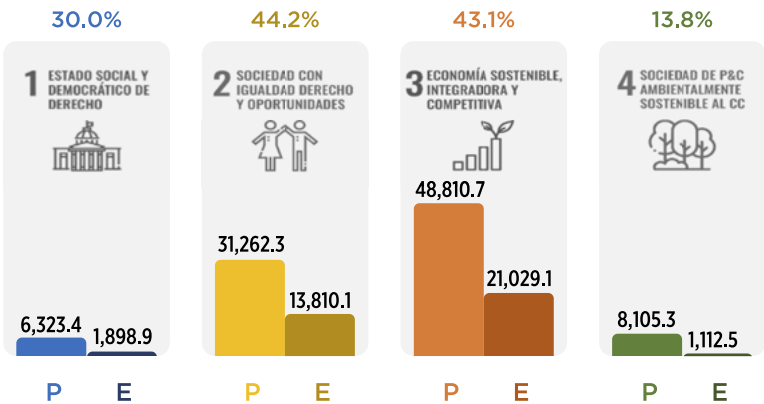

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública, MEPyD.

4. Proyectos con mayor ejecución entre enero-junio 2025

Tabla 1. Proyectos de Inversión Pública con mayor ejecución enero-junio 2025
(Millones de RD\$)

SNIP	Nombre del proyecto	Institución Ejecutora	Función	Subfunción	Situación presu- puestaria	Costo total	Programa- do	Ejecutado	% Ejec.
14558	Construcción línea 2c del metro de santo domingo tramos: alcarizos- luperón	OPRET	Transporte	Transporte por ferrocarril	Arrastre	38,111.47	7,867.65	2,856.25	36.3%
13656	Construcción hospital regional en san francisco de macorismacoris, prov. Duarte	MIVED	Salud	Planificación, gestión y supervisión de la salud		9,190.05	561.72	1,326.14	236.1%
16370	Construcción de infraestructura vial para el desarrollo turístico de cabo rojo, municipio pedernales, provincia pedernales*	MOPC	Transporte	Transporte por carretera		2,732.26	1,294.00	1,293.00	99.9%
16365	Construcción de paso a desnivel soterrado en la intersección de la av. Luperón con av. 27 De febrero, provincia santo domingo	MOPC				2,575.80	500.00	1,094.36	218.9%
15347	Reconstrucción de la infraestructura vial urbana del municipio santo domingo este	MOPC				7,920.99	800.00	1,046.13	130.8%
16785	Reparación de instalaciones deportivas del centro olímpico juan pablo duarte, distrito nacional.	MIVED	Actividades deportivas, recreativas, culturales y religiosas	Servicios recreativos y deportivos		3,350.69	679.69	900.54	132.5%
14534	Ampliación acueducto oriental barrera de salinidad y travase a santo domingo norte, fase ii	CAASD	Vivienda y servicios comunitarios	Abastecimiento de agua potable		7,350.97	1,197.93	861.39	71.9%
14649	Mejoramiento de 100,000 viviendas en la república dominicana	MIVED	Vivienda y servicios comunitarios	Urbanización y servicios comunitarios		9,076.51	3,323.70	752.69	22.6%
17003	Construcción de paso a desnivel en intersección prolongacion av. 27 De febrero con av. Isabel aguiar, municipio santo domingo oeste, provincia santo domingo*	MOPC	Transporte	Transporte por carretera	Nuevo	2,630.51	672.46	665.22	98.9%
14790	Construcción barrera de protección marina, tramo vial, obras conexas y complementarias en nagua, provincia maría trinidad sanchez.	MOPC			Arrastre	3,308.41	103.32	654.95	633.9%
						86,247.66	17,000.47	11,450.68	

*Se utilizó el dato del presupuesto vigente para el cálculo del porcentaje, dado que no hubo una programación inicial.

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública, MEPyD.

5. Anexos

Anexo 1. Proyectos de Inversión Pública según clasificación funcional, enero - junio 2025 (millones RD\$)

Funciones y subfunciones	Programado	Vigente	Ejecutado	Ejecutado/ vigente	Ejecución % del total
1.1.00 - Administración general	2,224.6	2,499.1	904.4	36%	2%
1.1.02 - Gestión administrativa, financiera, fiscal, económica y planificación	2,202.4	2,083.9	545.9	26%	1%
1.1.01 - Órganos ejecutivos y legislativos	4.1	397.1	357.0	90%	1%
1.1.05 - Gestión de la administración general para transversalizar el enfoque de género	8.3	8.3	1.5	19%	0%
1.1.03 - Transferencias a instituciones públicas incluidos los gobiernos locales	9.8	9.8	0.0	0%	0%
1.3.00 - Defensa nacional	2,455.4	2,461.0	859.7	35%	2%
1.3.01 - Defensa militar	1,555.4	1,731.0	661.6	38%	2%
1.3.03 - Defensa civil	900.0	730.0	198.2	27%	1%
1.4.00 - Justicia, orden público y seguridad	2,907.4	3,104.9	1,047.3	34%	3%
1.4.03 - Administración y servicios de justicia	705.4	1,288.5	558.3	43%	1%
1.4.01 - Servicios de seguridad interior	1,701.7	779.0	254.4	33%	1%
1.4.04 - Prisiones	494.8	1,009.8	234.6	23%	1%
1.4.02 - Servicios de protección contra incendios	5.5	27.6	0.0	0%	0%
2.1.00 - Asuntos económicos, comerciales y laborales	13.7	13.7	3.2	23%	0%
2.1.01 - Asuntos económicos y regulación del comercio	13.7	13.7	3.2	23%	0%
2.2.00 - Agropecuaria, caza, pesca y silvicultura	3,287.7	3,267.4	200.6	6%	1%
2.2.01 - Agropecuaria	917.7	922.3	118.1	13%	0%
2.2.04 - Conservación, ampliación y explotación racionalizada de reservas forestales.	252.4	252.4	76.9	30%	0%
2.2.99 - Planificación, gestión y supervisión agropecuaria, caza, pesca y silvicultura	2,082.6	2,082.6	5.7	0%	0%
2.2.02 - Caza y pesca	34.9	10.0	0.0	0%	0%
2.3.00 - Riego	3,921.1	5,193.4	842.4	16%	2%
2.3.01 - Riego	3,921.1	5,193.4	842.4	16%	2%
2.6.00 - Transporte	35,584.0	36,629.0	18,156.8	50%	48%
2.6.01 - Transporte por carretera	23,873.0	24,918.0	14,680.4	59%	39%
2.6.03 - Transporte por ferrocarril	11,172.6	11,172.6	3,451.7	31%	9%
2.6.99 - Planificación, gestión y supervisión del transporte	517.1	517.1	24.8	5%	0%
2.6.02 - Transporte por agua	21.2	21.2	0.0	0%	0%
2.7.00 - Comunicaciones	1,072.9	1,072.9	387.0	36%	1%
2.7.01 - Comunicaciones	1,072.9	1,072.9	387.0	36%	1%

Funciones y subfunciones	Programado	Vigente	Ejecutado	Ejecutado/ vigente	Ejecución % del total
2.9.00 - Otros servicios económicos	2,115.4	2,382.1	554.0	23%	1%
2.9.03 - Turismo	1,965.0	2,272.7	513.1	23%	1%
2.9.01 - Comercio de distribución almacenamiento y depósito	146.5	109.4	40.9	37%	0%
2.9.02 - Hoteles y restaurantes	3.9	0.0	0.0		0%
3.1.00 - Protección del aire, agua y suelo	5,093.9	6,894.9	2,472.6	36%	7%
3.1.03 - Ordenación de aguas residuales, drenaje y alcantarillado	3,755.2	5,521.9	2,386.9	43%	6%
3.1.02 - Administración del agua	1,338.7	1,373.0	85.6	6%	0%
3.2.00 - Protección de la biodiversidad y ordenación de desechos	2,230.1	2,134.8	156.7	7%	0%
3.2.10 - Restauración	1,102.0	1,102.6	141.9	13%	0%
3.2.02 - Ordenación de desechos	1,036.5	906.5	12.2	1%	0%
3.2.04 - Conciencia y conocimiento de la biodiversidad	91.6	91.6	2.6	3%	0%
3.2.99 - Planificación, gestión y supervisión de la protección del medio ambiente	0.0	34.0	0.0	0%	0%
4.1.00 - Vivienda y servicios comunitarios	13,139.9	14,178.0	4,939.3	35%	13%
4.1.03 - Abastecimiento de agua potable	7,472.8	9,634.4	3,381.6	35%	9%
4.1.01 - Urbanización y servicios comunitarios	5,052.3	3,745.6	1,360.7	36%	4%
4.1.02 - Desarrollo comunitario	614.8	798.1	197.0	25%	1%
4.2.00 - Salud	4,848.3	7,094.2	3,566.5	50%	9%
4.2.99 - Planificación, gestión y supervisión de la salud	611.7	1,755.6	1,433.7	82%	4%
4.2.03 - Servicios de la salud pública y prevención de la salud	2,770.3	3,300.7	1,285.9	39%	3%
4.2.02 - Servicios hospitalarios	1,462.2	1,987.5	846.8	43%	2%
4.2.04 - Servicios médicos en salud sexual/reproductiva y de centros de salud materno infantil	4.0	50.4	0.0	0%	0%
4.3.00 - Actividades deportivas, recreativas, culturales y religiosas	2,396.7	3,527.4	1,849.4	52%	5%
4.3.02 - Servicios recreativos y deportivos	2,018.6	2,953.6	1,522.1	52%	4%
4.3.03 - Servicios culturales	87.4	215.6	131.4	61%	0%
4.3.01 - Deportes de alto rendimiento	80.0	145.0	125.8	87%	0%
4.3.05 - Servicios religiosos y otros servicios comunitarios religiosos	209.4	201.8	70.2	35%	0%
4.3.99 - Planificación, gestión y supervisión de las Actividades Deportivas, Recreativas, Culturales y Religiosas	0.0	10.1	0.0	0%	0%
4.3.04 - Servicios de radio, televisióntelevisión y servicios editoriales	1.3	1.3	0.0	0%	0%

Funciones y subfunciones	Programado	Vigente	Ejecutado	Ejecutado/ vigente	Eje- cución % del total
4.4.00 - Educación	5,861.2	6,140.0	634.4	10%	2%
4.4.04 - Educación superior	407.8	666.5	302.1	45%	1%
4.4.02 - Educación primaria	2,678.5	3,375.4	221.4	7%	1%
4.4.01 - Educación inicial	2,460.4	1,751.7	107.9	6%	0%
4.4.06 - Educación técnica	314.4	330.8	2.9	1%	0%
4.4.07 - Educación vocacional	0.0	15.6	0.0	0%	0%
4.4.05 - Educación de adultos	0.1	0.1	0.0	0%	0%
4.5.00 - Protección social	1,581.8	1,508.8	275.4	18%	1%
4.5.06 - Desempleo	739.3	689.3	192.4	28%	1%
4.5.99 - Planificación, gestión y supervisión de la protección social	734.2	734.2	77.8	11%	0%
4.5.01 - Edad avanzada, pensiones	89.0	47.9	3.2	7%	0%
4.5.09 - Juventud	12.6	12.6	2.0	16%	0%
4.5.05 - Familia e hijos	6.7	24.7	0.0	0%	0%
2.4.00 - EnergíaEnergía y combustible	1,041.8	1,485.0	11.3	1%	0%
2.4.04 - Energía eléctrica de fuentes termoeléctricas	360.7	379.1	10.0	3%	0%
2.4.05 - Energía eléctrica de fuentes hidroeléctricas	631.1	980.0	1.3	0%	0%
2.4.08 - Energía eléctrica de fuentes nucleares	50.0	50.0	0.0	0%	0%
2.4.06 - Energía eléctrica de fuentes solares	0.0	75.8	0.0	0%	0%
3.3.00 - Cambio Climático	4,664.6	4,290.6	983.6	23%	3%
3.3.05 - Reducción del riesgo de desastres climáticos	4,664.6	4,132.4	983.6	24%	3%
3.3.06 - Respuesta y recuperación de desastres climáticos	0.0	158.2	0.0	0%	0%
2.5.00 - MineríaMinería, manufactura y construccionconstrucción	61.3	51.3	6.1	12%	0%
2.5.01 - Extracción de recursos minerales	50.8	50.8	6.1	12%	0%
2.5.02 - Manufacturas	10.6	0.6	0.0	0%	0%
Total general	94,501.7	103,928.5	37,850.5	36%	100%

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública, MEPyD.

Anexo 2. Índice de Ejecución de Proyectos

El Índice de Ejecución de Proyectos (IEP) es un indicador compuesto, que mide el grado de cumplimiento de la ejecución presupuestaria de proyectos de inversión pública a nivel institucional. Su objetivo principal es evaluar el desempeño de una institución en la gestión de los recursos financieros asignados.

El cálculo del IEP está compuesto por dos subindicadores:

1. Tasa de Ejecución Presupuestaria (TEP), que mide el monto total ejecutado por cada proyecto, en relación con el presupuesto institucional vigente.

$$TEP = \frac{\sum_{i=1}^N Ejec_i}{\sum_{i=1}^N (Presup_i)} \times 100$$

Donde:

- N = número total de proyectos con presupuesto asignado a la institución
- $Ejec_i$ = monto ejecutado del proyecto i
- $Presup_i$ = presupuesto anual asignado al proyecto i

En caso de que el cálculo se haga para el semestre, el presupuesto asignado anual se ajusta al ritmo esperado. Es decir, dado el tiempo transcurrido, lo que la institución debería haber ejecutado:

$$TEP^* = \frac{\sum_{i=1}^N Ejec_i}{\sum_{i=1}^N (Presup_i \times 0.5)} \times 100$$

El factor 0.5 ajusta el presupuesto anual al valor esperado de ejecución semestral (50 %)³.

2. Proporción de Proyectos Ejecutados (PPE), mide el grado de ejecución individual de cada uno de los proyectos vigentes bajo la responsabilidad de la institución.

$$PPE = \frac{\sum_{i=1}^N I(E_i \geq 50\%)}{N} \times 100$$

Donde:

- N = número total de proyectos con presupuesto asignado a la institución
- E_i = porcentaje de ejecución del proyecto i
- $I(E_i \geq 50\%) = 1$ si $E_i \geq 50\%$ y 0 en caso contrario

A partir de lo anterior, se puede computar el Índice de Ejecución de Proyectos, tal que:

$$IEP = (TEP \times 0.6) + (PPE \times 0.4)$$

Si **IEI > 100%** significa que la ejecución es superior a lo esperado en el periodo.

Si IEI se encuentra entre **80 % - 100 %** quiere decir que la institución lleva un ritmo un desempeño alto.

Si **50 % ≤ IEI < 79 %**, el desempeño es regular.

Si **IEI < 50 %** se interpreta como un desempeño bajo, y hay posibles retrasos en la ejecución.

³ Para la selección de este factor se verificó la ejecución histórica de las instituciones al primer semestre desde el 2016 hasta el 2024.

MINISTERIO DE HACIENDA



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

HACIENDA Y ECONOMÍA

